


EcoHeater

пуск, контрольный список

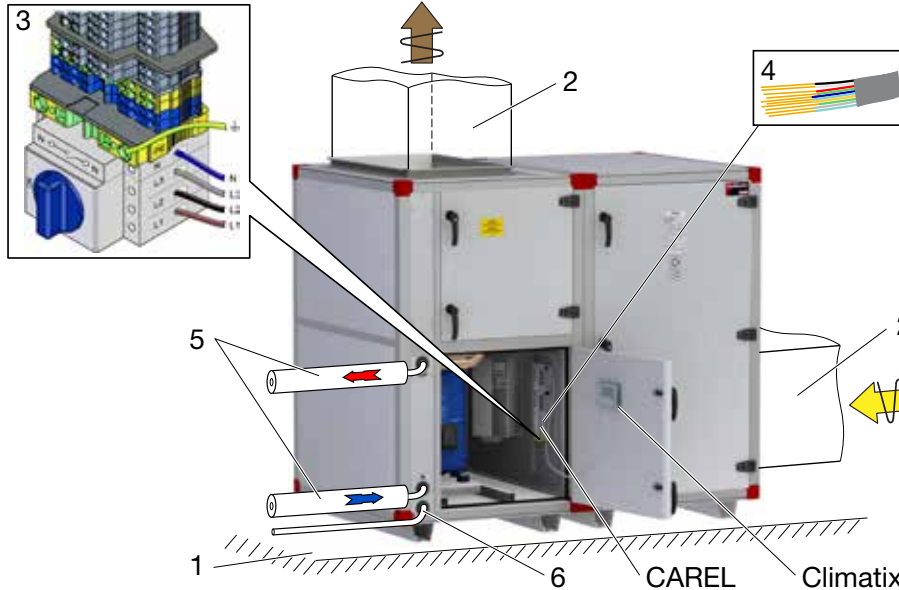

Модуль вентагрегата, пуск

Контролируйте выполнение:

1. установка на водо- и вибро- непроницаемую ровную поверхность; достаточная зона обслуживания; отсутствие в агрегате посторонних предметов
2. подключение воздухопроводов отработанного (к модулю теплонасоса) и вытяжного воздуха
3. подключение к питанию

Пуск вентилятора (с Climatix):

- A. главный выключатель в On/Вкл.
- B. никаких сообщений об ошибке, устранить ошибки при необходимости
- C. повернуть ручку-кнопку до строки ПЕРЕКЛЮЧАТ СЕРВИС, нажать ручку-кнопку, выбрать АВТО



Модуль теплового насоса/утилизация тепла, пуск

Контролируйте выполнение:

4. подключение 10-жильного кабеля к подстанции для обеспечения функций управления, например:
 - блокировка от циркуляционного насоса на стороне воды, по сигналу от датчика температуры наружного воздуха;
 - внешнее управление: сигнал потребности в тепле;
 - собственное управление: сигнал от датчика температуры прямой воды;
 Подробная электросхема Вашего заказа прилагается
5. подключения на стороне воды; спуск воздуха в самой высокой точке системы; соответствие расхода жидкости его проектному параметру
6. отвод конденсата в сливной колодец (гидрозатвор не требуется; теплый кабель в холодном помещении)
7. при собственном управлении: наладка параллельных кривых температуры (кривая T прямой воды в Climatix на 3 градуса выше кривой обслуживаемого здания)

Пуск теплонасоса (с CAREL):

- A. ВАЖНО! Картер компрессора должен быть нагрет до его пуска. Нагрев - автоматический, при включении напряжения к компрессору. Пуск разрешен, когда нижняя поверхность компрессора тепла на ощупь

B. Порядок пуска компрессора:

